

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

Raport przedsięwzięcia

(Trzeci przyrost)

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 17Ksantypa2-C3-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Wytwarzanie oprogramowania 3	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 2
Ostatnia modyfikacja: 14-05-2007	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Wersja wcześniejsza:

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 15Ksantypa2-C2-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Wytwarzanie oprogramowania 2	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 2
Ostatnia modyfikacja: 16-04-2007	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Zakres zmian:

- cały dokument

Spis treści

1. Harmonogram	2
2. Postęp projektu	2
3. Zespół	3
3. Technologia	3
3. Zarządzanie	3
3. Informacje dodatkowe.....	6

1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	W3 (12-04-2007 – 04.05.2007)
Wytwarzanie oprogramowania	C3 (12-04-2007 – 30.04.2007)

2. Postęp projektu

1. Czynności zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Modyfikacja zapytań aplikacji internetowej (PP_UC3, PP_UC4, PP_UC5, PP_UC6, PP_UC7, PP_UC8, PP_UC9)	TAK
Modyfikacja zapytań aplikacji administracyjnej (AA_UC1, AA_UC2, AA_UC6, AA_UC7, AA_UC8)	TAK
Eksport danych z bazy danych systemu Ksantypa2 do baz danych instancji wydziałowych Sokratesów	NIE (50% wykonane pomyślnie)
Obsługa danych bankowych	TAK
Obsługa pustych kont kandydatów	TAK
Obsługa kandydatów	TAK
Obsługa egzaminów	TAK
Odświeżanie serwisu WWW	TAK
Obsługa zarządzania wpłatami	TAK

2. Nieplanowane czynności

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Testowanie aplikacji internetowej	W TRAKCIE REALIZACJI
Implementacja nowych, dodatkowych wymagań danych o edukacji kandydata i związana z tym modyfikacja bazy danych Ksantypa2	W TRAKCIE REALIZACJI

3. Opóźnienia (jeśli są)

Opóźnienie	
Przybliżone opóźnienie [tygodnie]	Okolo dwóch tygodni
Powód	Opóźnienie powstałe wcześniejszymi problemami oraz konieczność jak najwcześniejszego przetestowania aplikacji internetowej; implementacja nowych, dodatkowych wymagań danych o edukacji kandydata i związana z tym modyfikacja bazy danych Ksantypa2
Podjęte akcje zapobiegawcze	Dokończenie zaplanowanych zadań podczas fazy testowania integracyjnego; zwiększenie tygodniowego nakładu czasu pracy oraz pomoc ze strony Zespołu zarządzającego

3. Zespół**1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby)**

Choroba jednego z kierowników przedsięwzięcia (od 18.04.2007 do obecnie).

2. Komunikacja z zespołem

Cotygodniowe spotkania w Poniedziałki i Piątki oraz ciągły kontakt drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 04-05-2007. Ostatnia wiadomość mailowa: 04-05-2007.

3. Komunikacja z klientem

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 04-04-2007. Ostatnia wiadomość mailowa: 04-05-2007.

4. Komunikacja z pozostałymi członkami zespołu

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 04-04-2007. Ostatnia wiadomość mailowa: 04-05-2007.

3. Technologia**1. Nowe problemy ze sprzętem komputerowym**

Brak.

2. Nowe problemy z oprogramowaniem



Brak.


3. Nowe problemy z wiedzą

Brak.

3. Zarządzanie**1. Czas pracy pojedynczego członka zespołu**


Rola	Imię i nazwisko	Czas [godziny]
Pierwszy kierownik przedsięwzięcia	Maciej Antczak	40
Drugi kierownik przedsięwzięcia	Grzegorz Palik	16 (w sali 426A) + 8 (w domu)
Programista, tester, wdrożeniowiec	Jacek Ziętek	82
Programista, tester, wdrożeniowiec	Jakub Tomczak	68
Programista, tester, wdrożeniowiec	Jarosław Cellary	41
Programista, tester, wdrożeniowiec	Michał Durski	45

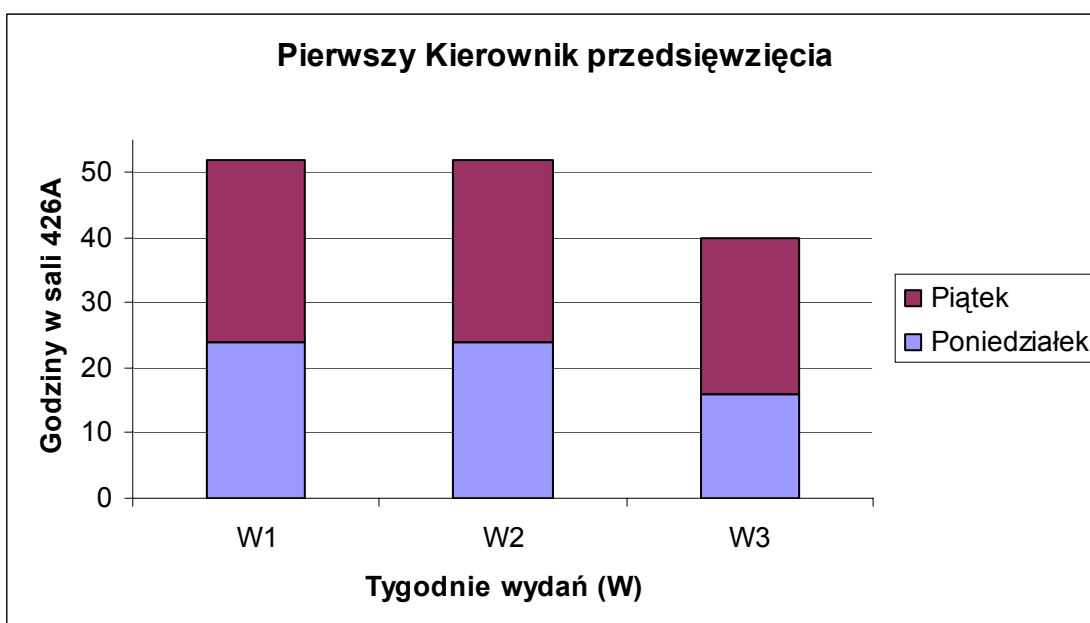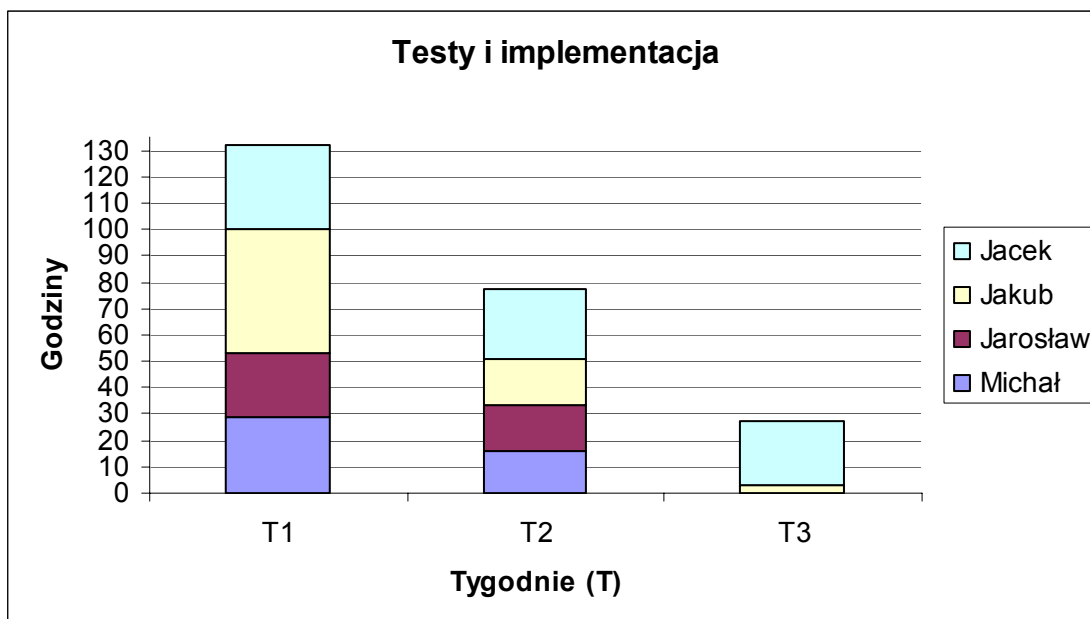

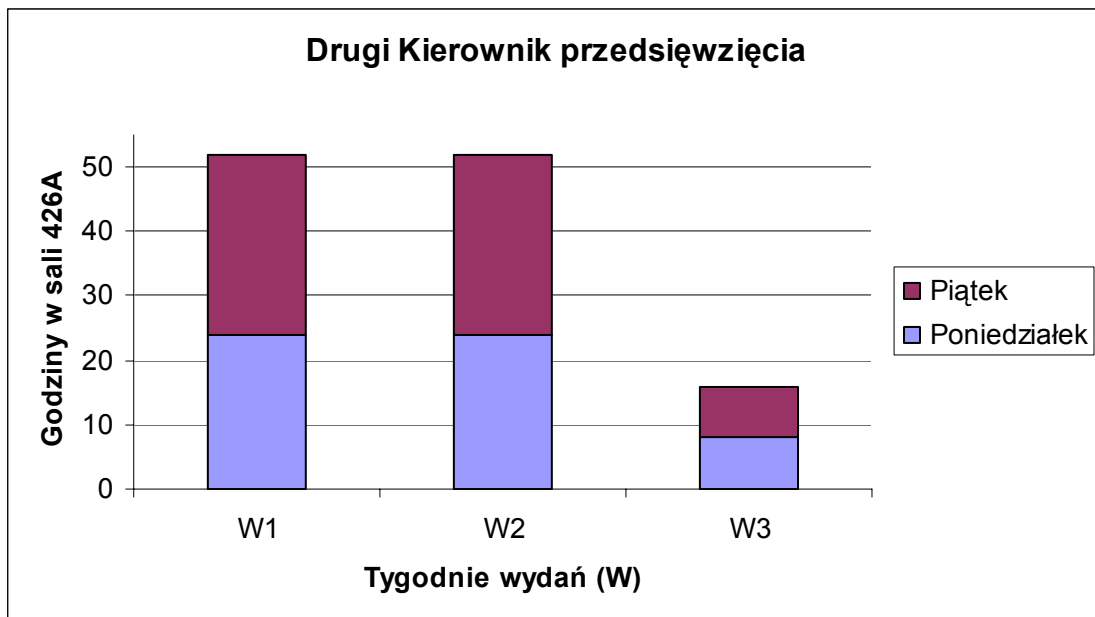


2. Liczba godzin pracy poświęcona pracy zespołowej od początku projektu

	Wydanie 1 [godziny]	Wydanie 2 [godziny]	Wydanie 3 [godziny]
Planowane minimalne	216	432	648
Planowane maksymalne	288	576	864
Faktyczne	246	445,5	681,5

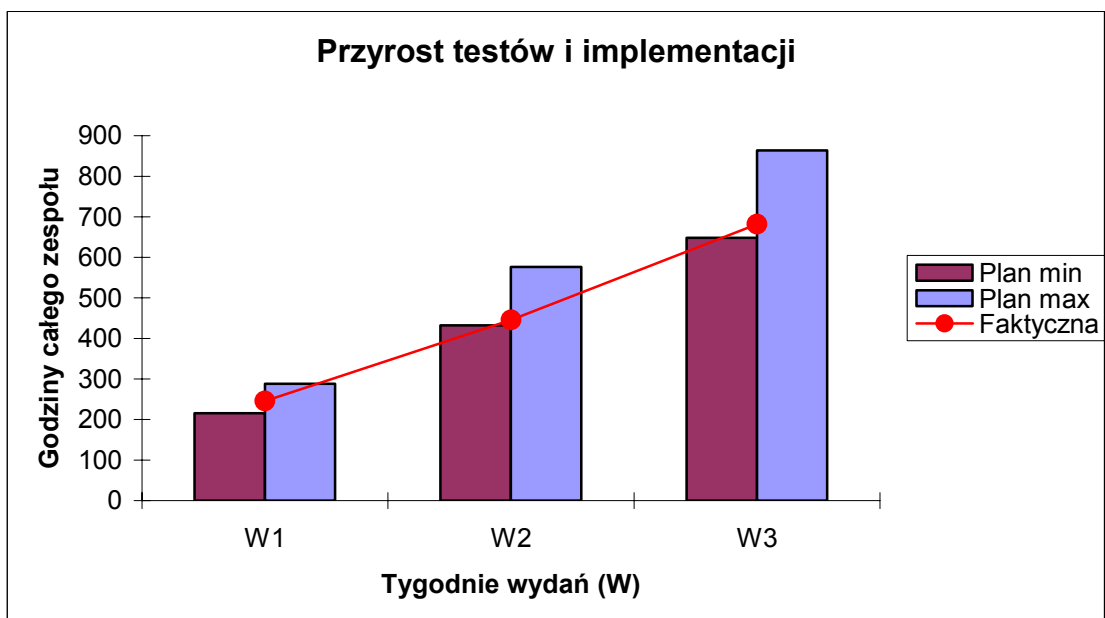

3. Liczba automatycznych testów akceptacyjnych

	Wydanie 1	Wydanie 2	Wydanie 3
Zakończone powodzeniem	0	0	0
Zakończone błędem	0	0	0

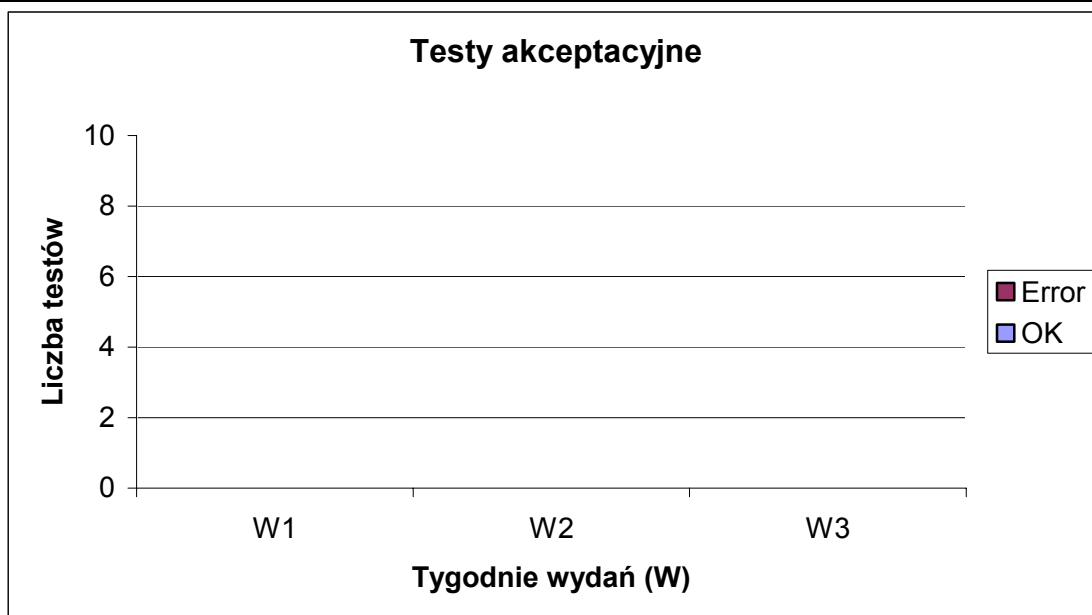

3. Informacje dodatkowe

W trakcie implementacji przeprowadzane są testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2 wykonywane przez programistów/testerów/wdrożeniowców.

***** KONIEC DOKUMENTU *****
