

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

## Raport przedsięwzięcia

(Czwarty przyrost)

<b>Status:</b> Gotowy do przeglądu	<b>Nazwa pliku:</b> 28Ksantypa2-C4-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
<b>Etap:</b> Wytwarzanie oprogramowania 4	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> Maciej Antczak, Grzegorz Palik	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> 2
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> 03-03-2008	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> 0

Wersja wcześniejsza:

<b>Status:</b> -	<b>Nazwa pliku:</b> -
<b>Etap:</b> -	<b>Adres strony WWW:</b> <a href="http://www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl">www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl</a>
<b>Autor:</b> Maciej Antczak, -	<b>Czas pracy autora [godz.]:</b> -
<b>Ostatnia modyfikacja:</b> -	<b>Czas pracy innych osób [godz.]:</b> -

Zakres zmian:

- cały dokument

## Spis treści

<b>1. Harmonogram .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Postęp projektu .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Zespół .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Technologia .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Zarządzanie .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Informacje dodatkowe.....</b>	<b>5</b>

### 1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	W4 (04-02-2008 – 02.03.2008)
Wytwarzanie oprogramowania	C4 (04-02-2008 – 02.03.2008)
Testowanie oprogramowania	T4 (25-02-2008 – 31.03.2008)

### 2. Postęp projektu

#### 1. Czynności zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Instalacja bazy danych Oracle	<b>TAK</b>
Modyfikacja skryptów SQL integratora	<b>TAK</b>
Zapoznanie się z biblioteką GWT	<b>TAK</b>
Zapoznanie się z biblioteką GWT-Ext	<b>TAK</b>
Zapoznanie się z formatem wymiany danych JSON	<b>TAK</b>
Uspójnienie formatu przechowywania informacji pomiędzy systemem Sokrates a systemem Ksantypa2: imiona, nazwiska, imię matki, imię ojca, miejscowość, WKU – duża pierwsza litera, reszta liter małych (dokładne sprawdzenie formatów w systemie Sokrates i dodanie odpowiednich filtrów w systemie Ksantypa2)	<b>TAK</b>
Zmiana pola wyboru WKU przez mężczyzn na opcjonalne	<b>TAK</b>
Powiększenie rozmiaru pola e-mail	<b>TAK</b>
Udoskonalenie komunikatu do osób, które już studiuja (zmiana informacji w systemie)	<b>TAK</b>
Zwiększenie widoczności przycisk drukuj (poprawienie grafiki systemu)	<b>TAK</b>
Usunięcie wyboru skali ocen dla nowej matury	<b>TAK</b>

Dodanie forum dla kandydatów z najczęstszymi pytaniami	<b>TAK</b>
Wysyłanie wiadomości potwierdzającej e-mail do kandydata	<b>TAK</b>

## 2. Nieplanowane czynności

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Brak	-

## 3. Opóźnienia (jeśli są)

Opóźnienie	
Przybliżone opóźnienie [tygodnie]	Brak
Powód	-
Podjęte akcje zapobiegawcze	-

## 3. Zespół

### 1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby)

Brak.

### 2. Komunikacja z zespołem

Cotygodniowe spotkania we Wtorki, Czwartki i Piątki oraz ciągły kontakt drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 29-02-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 01-03-2008.

### 3. Komunikacja z klientem

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 25-02-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 01-03-2008.

### 4. Komunikacja z pozostałymi członkami zespołu

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 25-02-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 01-03-2008.

## 3. Technologia

### 1. Nowe problemy ze sprzętem komputerowym

Brak.

### 2. Nowe problemy z oprogramowaniem

Brak.

### 3. Nowe problemy z wiedzą


Brak.


## 3. Zarządzanie

### 1. Czas pracy pojedynczego członka zespołu

Rola	Imię i nazwisko	Czas [godziny]
Pierwszy kierownik przedsięwzięcia	Maciej Antczak	65
Drugi kierownik przedsięwzięcia	Grzegorz Palik	65
Programista, tester, wdrożeniowiec	Jacek Ziętek	44


Programista, tester, wdrożeniowiec	Jakub Tomczak	95
Programista, tester, wdrożeniowiec	Michał Durski	61,5

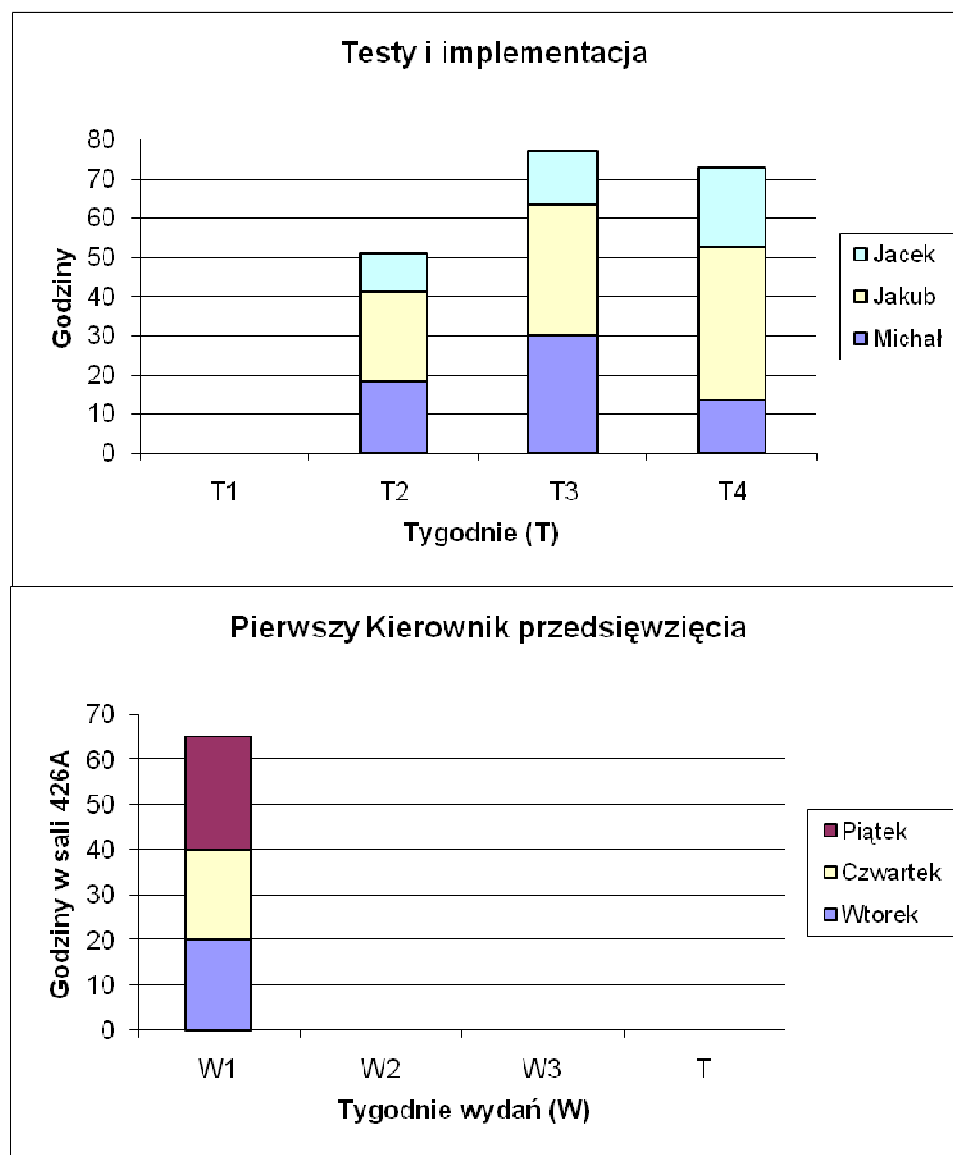

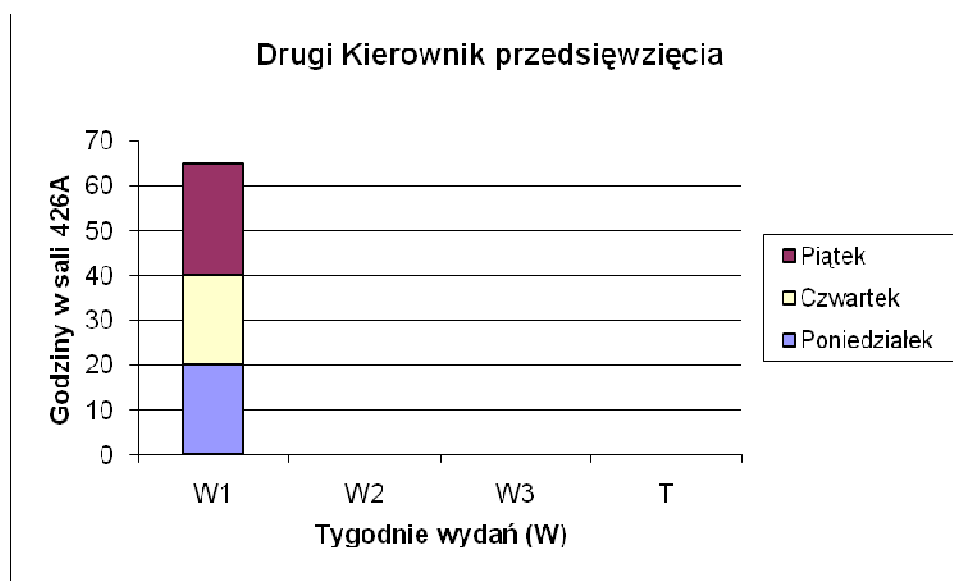

## 2. Liczba godzin pracy poświęcona pracy zespołowej od początku projektu

	Wydanie 1 [godziny]	Wydanie 2 [godziny]	Wydanie 3 [godziny]
Planowane minimalne	216	432	648
Planowane maksymalne	288	576	864
Faktyczne	200,5	-	-

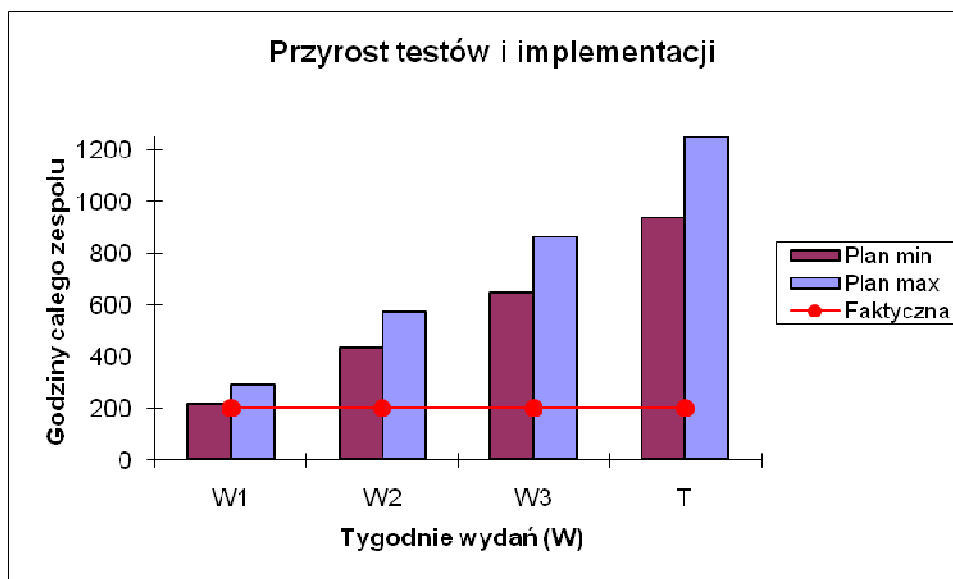

## 3. Informacje dodatkowe

W trakcie implementacji przeprowadzane są testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2 wykonywane przez programistów/testerów/wdrożeniowców.

\*\*\*\*\* KONIEC DOKUMENTU \*\*\*\*\*
