

Ksantypa2: system rekrutacji na PP

Raport przedsięwzięcia

(Szósty przyrost)

Status: Gotowy do przeglądu	Nazwa pliku: 32Ksantypa2-C6-Report-M.Antczak,G.Palik-1.0.doc
Etap: Wytwarzanie oprogramowania 6	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: Maciej Antczak, Grzegorz Palik	Czas pracy autora [godz.]: 2
Ostatnia modyfikacja: 01-05-2008	Czas pracy innych osób [godz.]: 0

Wersja wcześniejsza:

Status: -	Nazwa pliku: -
Etap: -	Adres strony WWW: www.ksantypa2.cs.put.poznan.pl
Autor: -	Czas pracy autora [godz.]: -
Ostatnia modyfikacja: -	Czas pracy innych osób [godz.]: -

Zakres zmian:

- cały dokument

Spis treści

1. Harmonogram	2
2. Postęp projektu	2
3. Zespół	3
3. Technologia	3
3. Zarządzanie	3
3. Informacje dodatkowe.....	5

1. Harmonogram

Faza realizacji projektu	
Wydanie	W6 (01-04-2008 – 30.04.2008)
Wytwarzanie oprogramowania	C6 (01-04-2008 – 30.04.2008)
Testowanie oprogramowania	T6 (23-04-2008 – 30.05.2008)

2. Postęp projektu

1. Czynności zaplanowane do wykonania na trzeci przyrost

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Uaktualnienie schematu bazy danych	TAK
Modyfikacja eksportu i importu danych	NIE (50% wykonane pomyślnie)
Poprawienie interfejsu użytkownika: po zalogowaniu kandydata system zaprezentuje listę kierunków z informacją czy dany kierunek jest opłacony oraz informację o konieczności wydrukowania podania i innych dokumentach, które należy złożyć w Dziekanacie; zmniejszenie ilości opisów, czcionki, układu, zmniejszenie ilości informacji na stronie z wyborem kierunków – „ <i>tooltip</i> ”	TAK
Modyfikacja statystyk uwzględniających priorytety kierunków zdefiniowane przez kandydatów	TAK
Dodanie strony wstępnej „powitalnej” z krótką instrukcją logowania, wykazem kompletu kierunków i specjalności, informacjami o formularzach „zmiana danych” i „oświadczenie woli”, informacjami o numerach faksów oraz spisem kompletu dokumentów jaki należy złożyć	TAK
Stworzenie internetowej wersji aplikacji administracyjnej bazującej na wcześniejszej wersji aplikacji administracyjnej	NIE (50% wykonane pomyślnie)
Wgrywanie i przechowywanie zdjęcia kandydata w bazie danych systemu	TAK
Aktualizacja mechanizmu zarządzania priorytetami kierunków	TAK

2. Nieplanowane czynności

Nazwa zadania	Czy wykonane (jeśli nie, to w ilu procentach)
Brak	-

3. Opóźnienia (jeśli są)

Opóźnienie	
Przybliżone opóźnienie [tygodnie]	Okolo dwóch tygodni
Powód	Opóźnienie powstałe wcześniejszymi problemami; implementacja i testowanie nowych komponentów w aplikacji administracyjnej oraz przygotowanie okien aplikacji administracyjnej
Podjęte akcje zapobiegawcze	Dokończenie zaplanowanych zadań podczas fazy testowania; zwiększenie tygodniowego nakładu czasu pracy oraz pomoc ze strony Zespołu zarządzającego

3. Zespół**1. Nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, choroby)**

Brak.

2. Komunikacja z zespołem

Cotygodniowe spotkania w Czwartki i Piątki oraz ciągły kontakt drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 25-04-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 30-04-2008.

3. Komunikacja z klientem

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 28-04-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 30-04-2008.

4. Komunikacja z pozostałymi członkami zespołu

Sporadyczne spotkania oraz komunikacja drogą mailową. Ostatnie spotkanie: 28-04-2008. Ostatnia wiadomość mailowa: 30-04-2008.

3. Technologia**1. Nowe problemy ze sprzętem komputerowym**

Brak.

2. Nowe problemy z oprogramowaniem

Brak.



3. Nowe problemy z wiedzą


Brak.

3. Zarządzanie**1. Czas pracy pojedynczego członka zespołu**

Rola	Imię i nazwisko	Czas [godziny]
Pierwszy kierownik przedsięwzięcia	Maciej Antczak	51
Drugi kierownik przedsięwzięcia	Grzegorz Palik	51
Programista, tester, wdrożeniowiec	Jacek Ziętek	72


Programista, tester, wdrożeniowiec	Jakub Tomczak	90,5
Programista, tester, wdrożeniowiec	Michał Durski	88

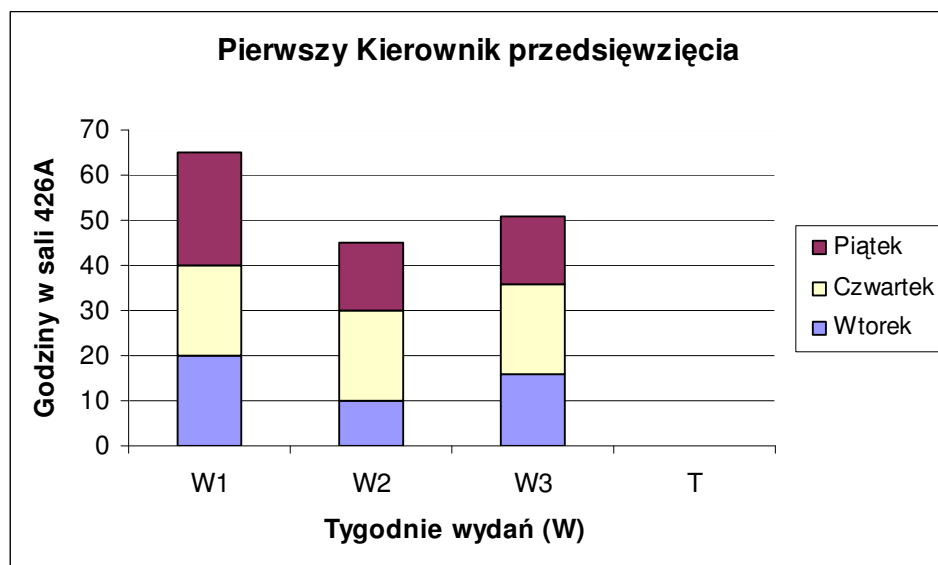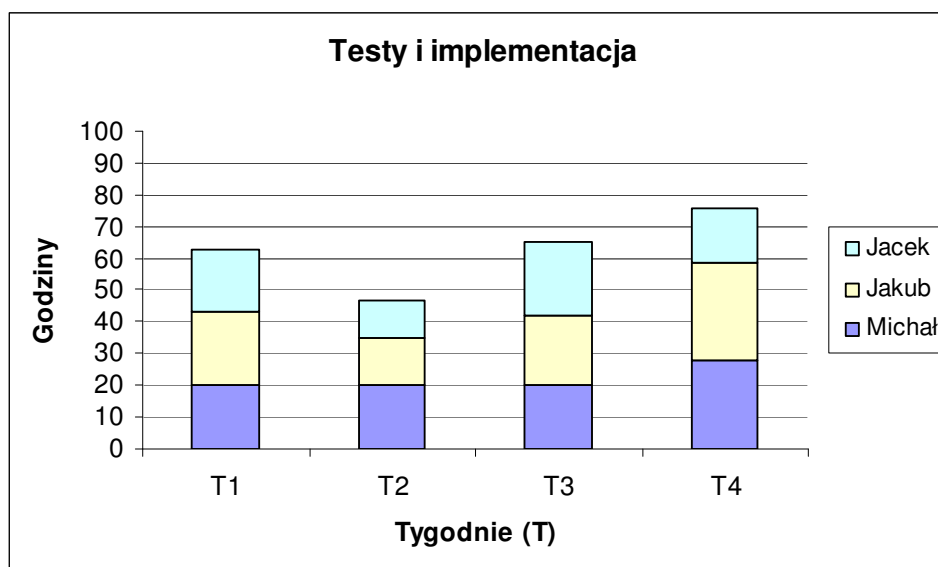

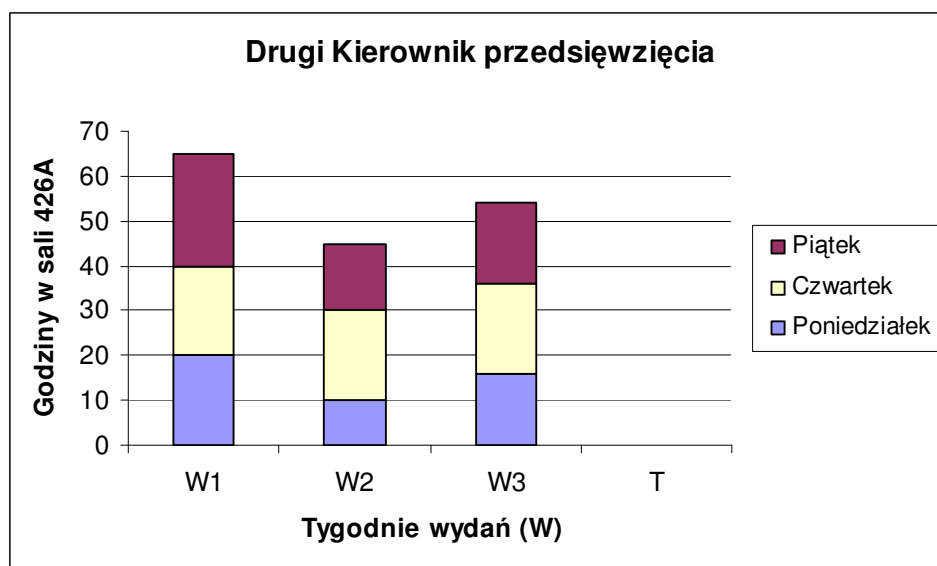

2. Liczba godzin pracy poświęcona pracy zespołowej od początku projektu

	Wydanie 1 [godziny]	Wydanie 2 [godziny]	Wydanie 3 [godziny]
Planowane minimalne	216	432	648
Planowane maksymalne	288	576	864
Faktyczne	200,5	451	701,5

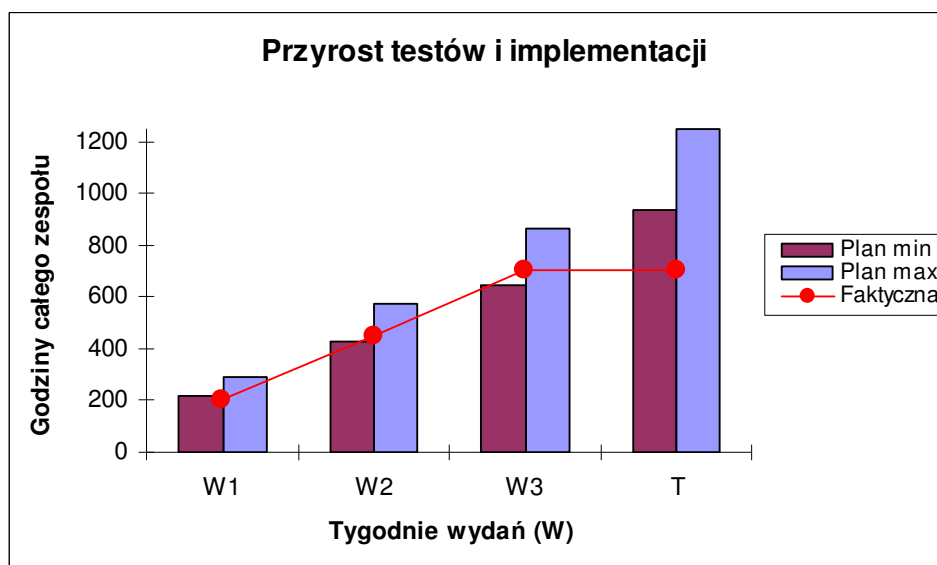

3. Informacje dodatkowe

W trakcie implementacji przeprowadzane są testy jednostkowe i akceptacyjne systemu Ksantypa2 wykonywane przez programistów/testerów/wdrożeniowców.

***** KONIEC DOKUMENTU *****
